

ELENCO TAVOLE

01

02

03

04

05

A

B

C

D

E

F

G

H

~~I~~

L

M

N

REV. N.

DATA

MODIFICHE

REDATTO

APPROVATO

COMUNE DI RAGUSA

PROVINCIA DI RAGUSA

PROGETTO ESECUTIVO**SISTEMAZIONE VIALETTI E ILLUMINAZIONE
VOTIVA 2° AMPLIAMENTO CIMITERO DI RAGUSA IBLA**


LUCIASUTERA
ingegnere edile architetto

Ing. Lucia Sutera

Tel. 329 34 985 15

P.I. 01731110886

C.F. STR LCU 84E49 B428H

lucia.sutera@ingpec.eu

DITTA

COMUNE DI RAGUSA
SERVIZIO 3
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI,
CONCESSIONI E CONTRATTI

TAV. N.

CONTENUTO

PROGETTISTA

Ing. Lucia Sutera

Collaboratori

I

● CRONOPROGRAMMA LAVORI



scala varie

A4

REV. N. 00

FILE: _____

C.F. STR LCU 84E49 B428H

DATA 04/05/2022

RESP. PROCEDIMENTO


SEDUTA C.E.C. DEL _____

IL SINDACO

FIRMA COMPONENTI C.E.C.

Nome attività	Durata	29 Ago 22		05 Set 22				12 Set 22														
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	84 g	▶																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali €	2 g					Z1																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g							Z1														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																				
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g							Z1														
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g									Z1												
Smobilizzo del cantiere	4 g																					
DEMOLIZIONI E TAGLI	2 g																					
Demolizione di tomagnature	1 g																					
Taglio di muratura a tutto spessore	1 g																					
SCAVI E RINTERRI	40 g																					
Tracciamento dell'asse di scavo	2 g																					
Rinterro di scavo	3 g																					
Scavo a sezione obbligata	6 g																					
Scavo eseguito a mano	4 g																					
OPERE EDILI IN GENERE	20 g																					
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	8 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	4 g																					
Posa di recinzioni e cancellate	5 g																					
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	3 g																					
CEMENTO ARMATO	22 g																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g																					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	3 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	2 g																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	2 g																					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2 g																					
SERVIZI E IMPIANTI A RETE	28 g																					
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	6 g																					
Posa di conduttura elettrica	3 g																					
Posa di conduttura idrica	4 g																					
Posa di speco fognario prefabbricato	3 g																					
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	5 g																					
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	3 g																					

07 Nov 22			14 Nov 22			21 Nov 22			28 Nov 22			05 Dic 22			12 Dic 22			19 Dic 22																													
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

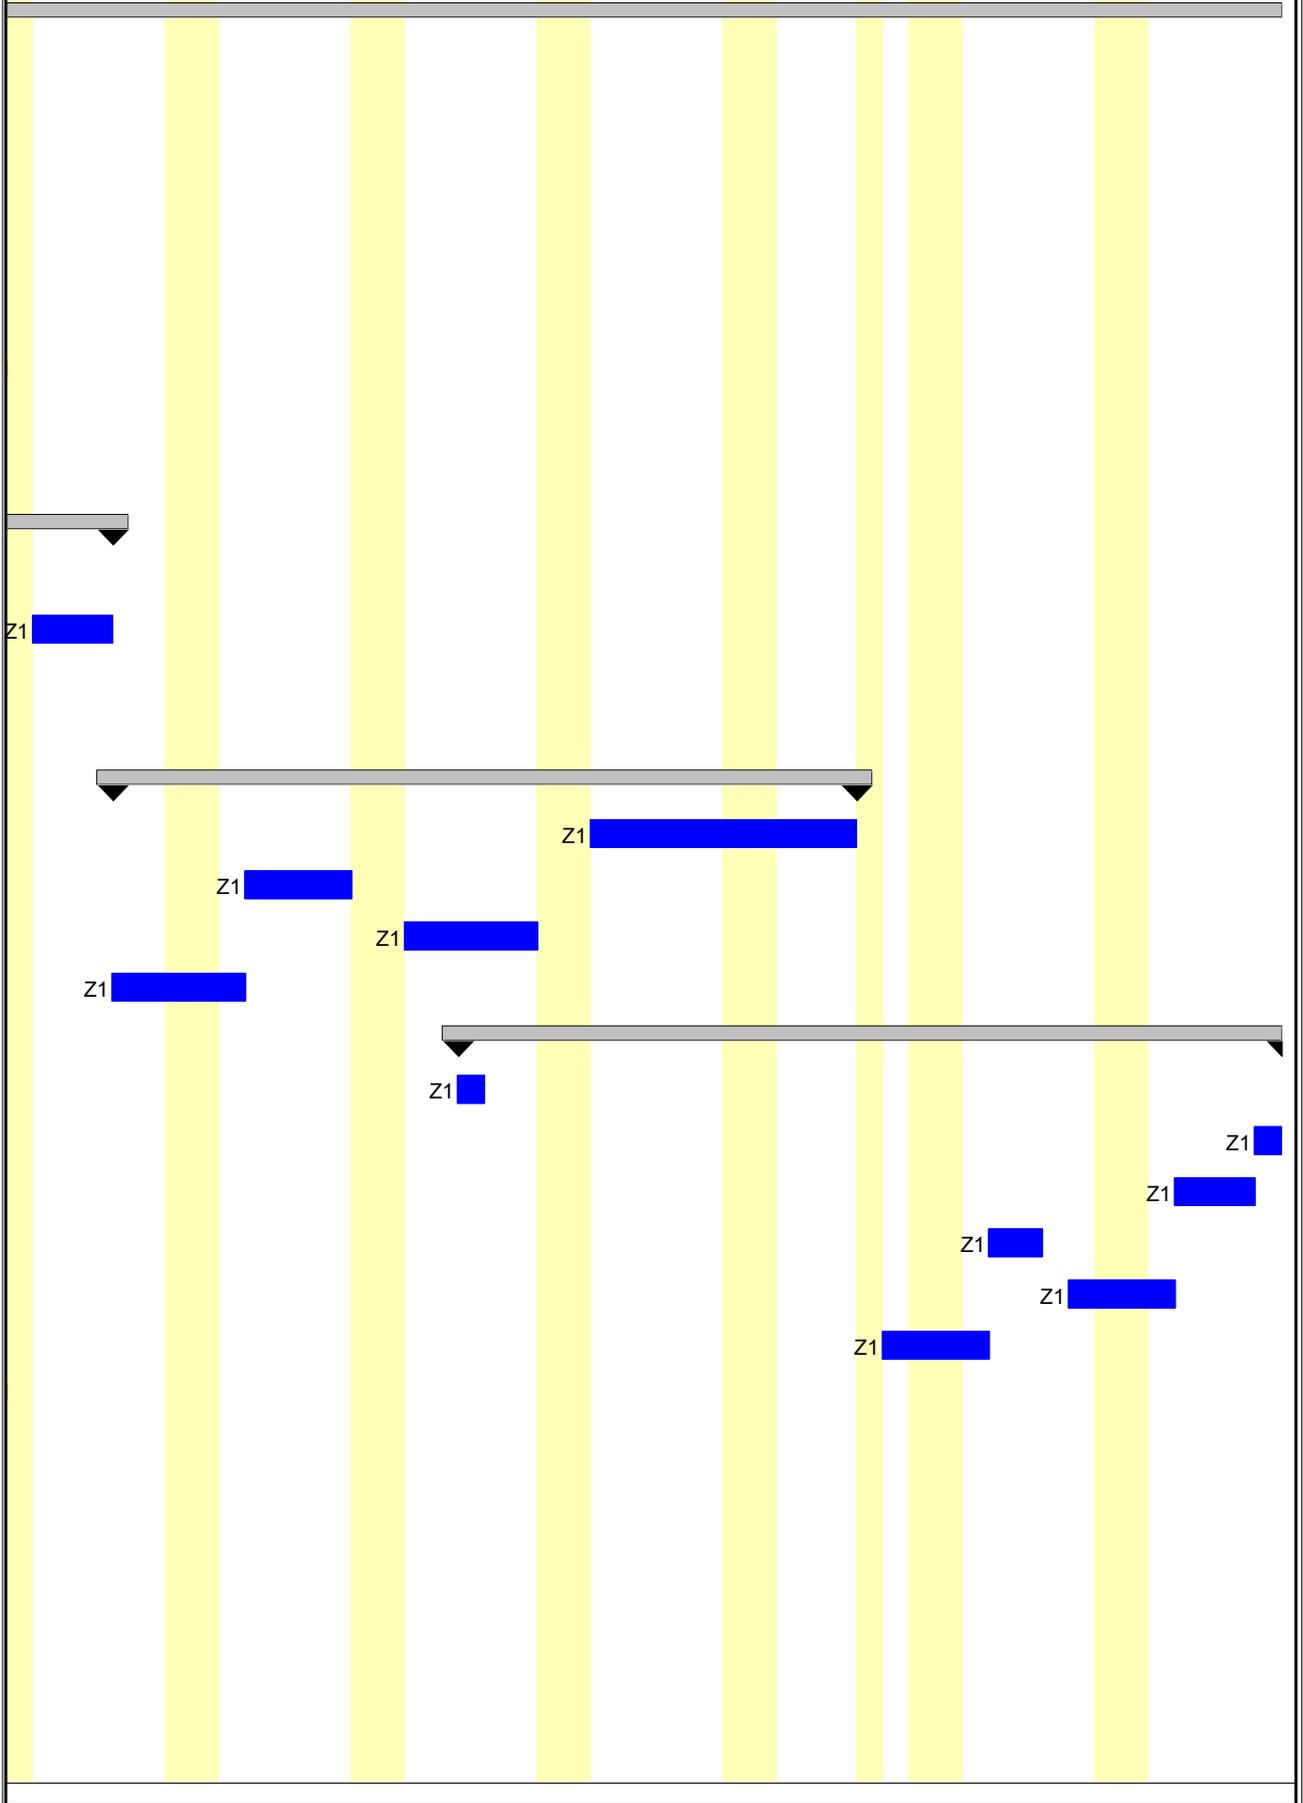

07 Nov 22				14 Nov 22				21 Nov 22				28 Nov 22				05 Dic 22				12 Dic 22				19 Dic 22																							
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

26 Dic 22			02 Gen 23			09 Gen 23			16 Gen 23			23 Gen 23			30 Gen 23			06 Feb 23																													
24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
